
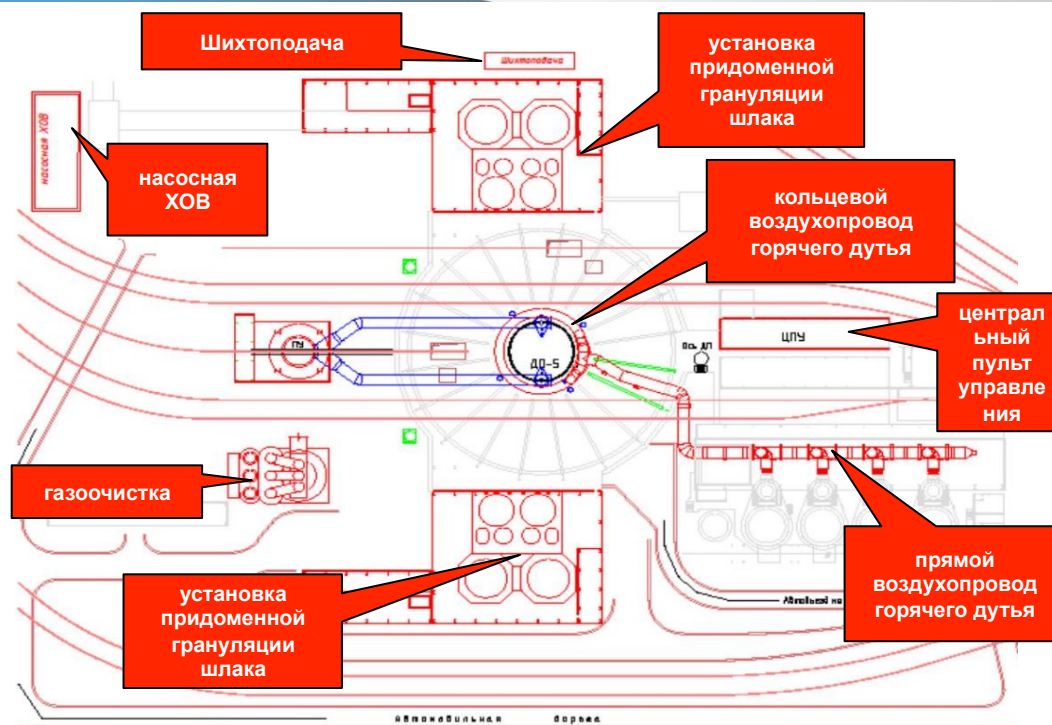


Проект «КАДП. Реконструкция комплекса доменной печи №5»

Статус реализации проекта

Санкт-Петербург, 15.08.2017

Объемы работ по ДП-5 выполняемые собственными силами ПАО «Северсталь»

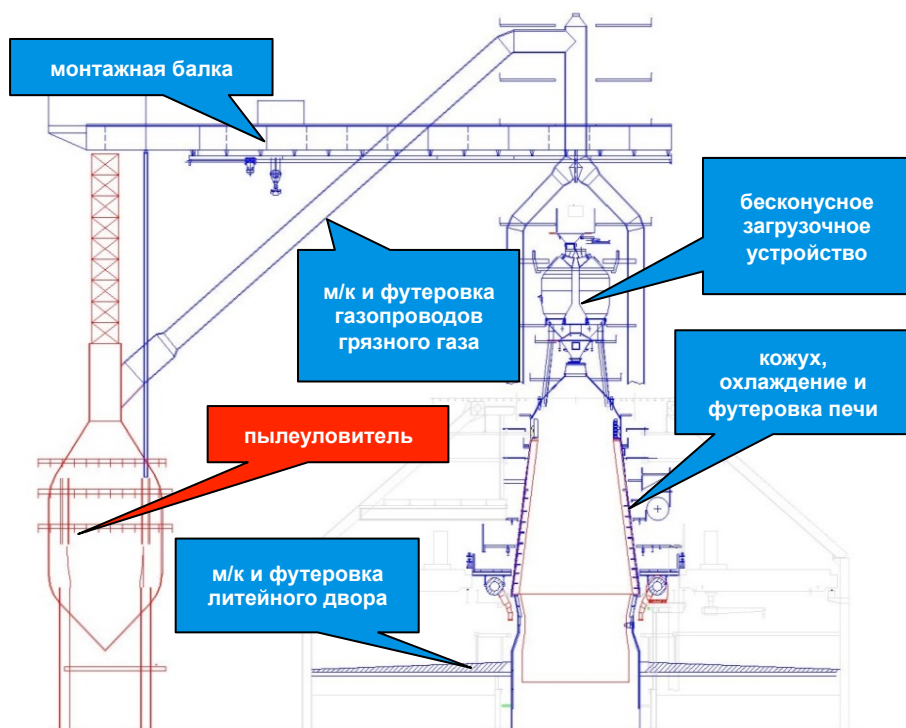

Работы ЦДР

- бесконусное загрузочное устройство (БЗУ) и площадки верха печи
- кожух печи
- охлаждение печи
- футеровка печи
- м/к и футеровка литейного двора
- замена м/к и футеровки газопроводов грязного доменного газа (ГДГ)
- замена м/к монтажной балки

Работы субподряда

- замена м/к КВГД и ПВГД
- замена футеровки КВГД и ПВГД
- замена м/к и футеровки ПУ
- внешняя энергетика
- эл.монтажные, КИПиА
- строительство станции ХОВ
- газоочистка
- шихтоподача
- реконструкция УПГШ

м/к – металлоконструкции, КВГД – кольцевой воздухопровод горячего дутья, ПВГД – прямой воздухопровод горячего дутья, ПУ – пылеуловитель, КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика, ГДГ – газопровод грязного доменного газа, ХОВ – химически очищенная вода, УПГШ – установка придоменной грануляции шлака
